

工事名：平成25年度 1号堀越高架橋東地区橋脚補強工事

発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所 道路管理第二課 掛川国道維持出張所

工期：平成25年5月23日 ～ 平成26年2月28日 担当者：丹羽 伸孝

《現場代理人》



こんにちは、現場代理人の丹羽 伸孝です。
おかげさまで工事も順調に進んでおります。ありがとうございます。

現場ではコンクリート打設前は、関係者と**打設前検討会**を開き
最終確認後の打設となります。
今月も『安全第一』で工事を進めていきます。

《10月の作業》



型枠組立完了後、鉄筋と型枠の間隔が設計値どおりになっているか最終確認します。



コンクリートはポンプ車を2台セットし生コンの打設ムラがでないように、また、水平な仕上がりとなるように(赤矢印)2箇所から生コンを入れました




打設後は直ぐに、シートで覆い**コンクリート養生**(2週間以上)を行います。
その後、型枠を外し**家庭で使う食品ラップフィルム**の大型版で巻き、保存します。
コンクリートが急激に乾燥すると**クラック**が入り**易**くなります。
フィルムは**クラック防止**のために行っています

《11月の作業》

下写真のように**プラケット・チェーン**を取り付ける作業を行います。

この写真は、浜松市安新町設置しています。

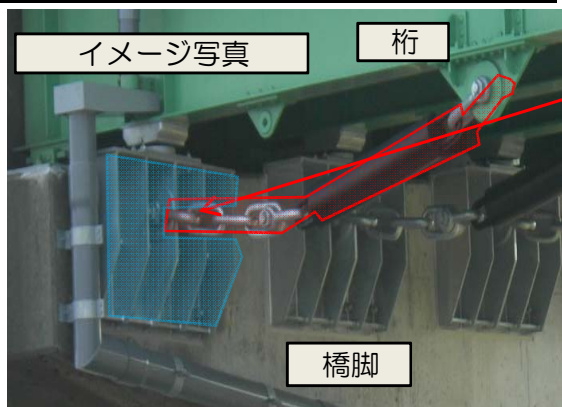

緩衝ゴム付きチェーン
大地震などの強い衝撃により桁が落ちないようにするために橋脚にチェーンを付けます。引っ張られる際、大きな力がかかるので、それを和らげるため**ゴム**が付いています。

お知らせ

(株)藤本組では、小学生の社会科学習の一環としてとして『現場見学会』を実施しています。
11月29日(金曜日)
9:30~11:30(小学生学習時間)

現場は引き続き『安全第一』で進めます。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。



株式会社 藤本組

〒436-0114
掛川市高田149-1
☎ 0537-26-1105
fax 26-1109

工事現場見学のご希望やご意見、工事のご依頼などもございましたら、お気軽にご連絡ください。

※『げんばかわら版』は、工事箇所周辺にお住まいの皆様へ、工事の進捗状況と、今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。
