

# げんばかわら版

12月号（第3回）

発行：(株)藤本組

工事名：平成26年度 農村災害対策整備事業（整備事業）  
袋井東地区排水路2工事  
発注者：静岡県 中遠農林事務所 農地防災課  
工期：平成26年9月30日 ～ 平成27年2月27日

担当者： 鈴木 祥哲 よしのり

## 《担当者あいさつ》




こんにちは。早いもので今年もあとわずかとなりました。暮れのあわただしい中、この「げんばかわら版」を読んでいただき、ありがとうございます。

私どもが行っている工事の内容ですが、当初、排水路の基礎は「割栗石」と呼ばれる石を厚さ15cmで並べ、その上に製品水路（柵渠）を並べる計画でした。しかし、当該地は御存じのとおり非常に土質が悪いため、製品水路（柵渠）が沈下してガタガタになることが予想されました。そこで、私どもで「マットレス工」を設計・提案し、発注者様に了承を得て、当初より強い基礎形式で工事を進めることが出来ています。

また、工事で発生する残土は、地権者様の了承を得て、一部を農地へ入れさせて頂くことになりました。

今年は雨の日が多かったので、作業は予定より少し遅れ気味です。来年はスタートダッシュして、遅れを取り戻したいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

## 基礎を当初より強い形式に変更しました

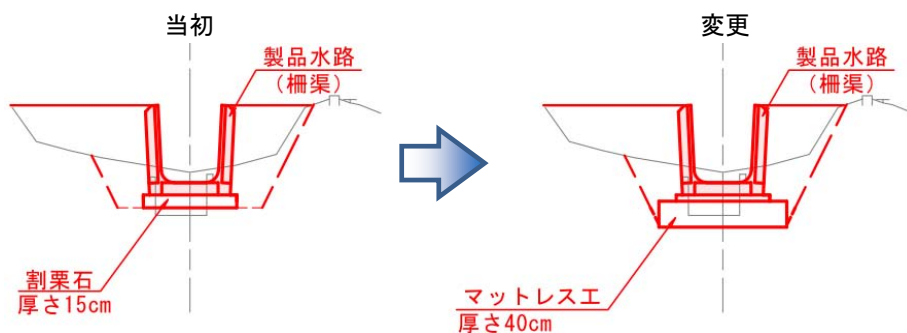

割栗石



マットレス工①  
ジオテキスタイルという特殊な網の中に砕石を敷きます。



マットレス工②

砕石をくんで網を閉じ、リングで止めて開かないようにします。



### ＜現場状況＞

掘削底面は非常に軟弱で長靴が潜ってしまいます。

ためにしに鉄の棒を刺すと、スイスイ入ってしまいます。

### ＜進捗報告＞

市道村松14号線と交差する「ボックスカルバート」を設置しました。

お  
願  
い

- ①現在、通行止めをしている「市道村松14号線」は、**年末・年始も通行止め**になります。引き続き御不便をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
- ②土を移動するダンプトラックを始め、工事車両が**頻繁に出入り**します。交通安全に十分配慮するよう、気を付けて参ります。お気づきの点がございましたら、鈴木まで連絡をお願いします。
- ③村松西公会堂前の「市道村松鷺津線」は、1月下旬から通行止め規制を行う予定です。詳しくは1月の『げんばかわら版』でお伝えしたいと思います。



株式会社 藤本組  
〒436-0114  
掛川市高田149-1  
☎ 0537-26-1105  
fax 26-1109

見学のご希望や、工事のご依頼などございましたら、お気軽にご連絡ください。

※『げんばかわら版』は、工事箇所周辺にお住まいの皆様にご覧いただき、工事の進捗状況と今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。
